

Схема реализации мероприятий в рамках предоставления комплекса услуг по газификации (без участия МФЦ)

Этап 1. подача и рассмотрение заявки


Срок выполнения мероприятий по Этапу №1  
Новая схема

1	3 раб. дн.	При условии наличия у заявителя всего комплекта документов в соответствии с требованиями ПП РФ 1547
2	20 раб. дн.	При условии отсутствия при подаче заявки части документов в соответствии с требованиями ПП РФ 1547


Сущ. схема Эффект

3 раб. дн.	-
20 раб. дн.	-

\* На этапе пилотной эксплуатации задачи по обработке заявки на заключение договора поставки газа (заявка ПГ) на Портале ЕОГ будут выполняться ГРО

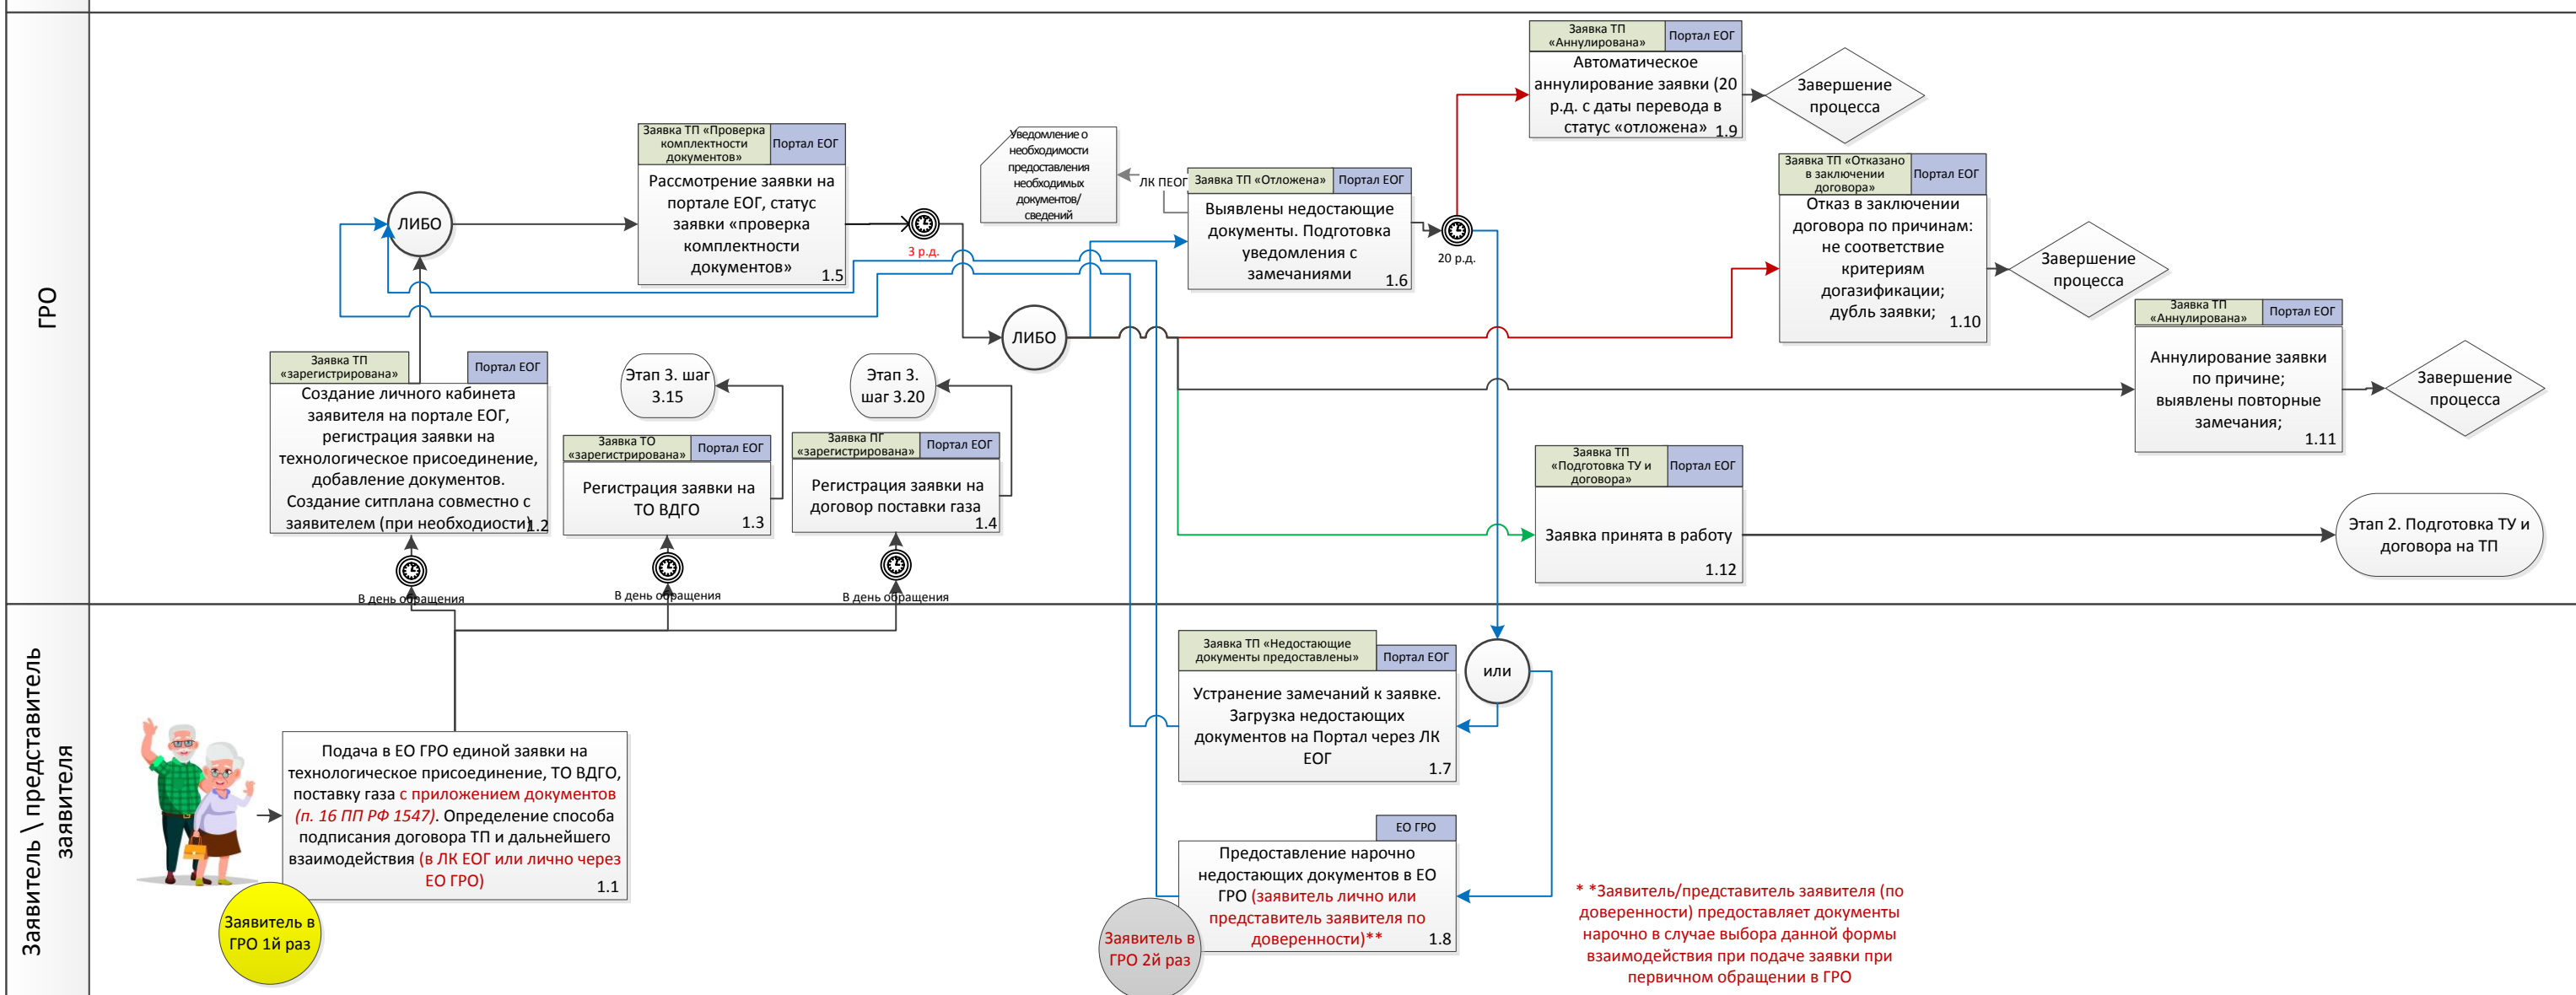

Заявитель / представитель заявителя



Подача в ЕО ГРО единой заявки на технологическое присоединение, ТО ВДГО, поставку газа с приложением документов (п. 16 ПП РФ 1547). Определение способа подписания договора ТП и дальнейшего взаимодействия (в ЛК ЕОГ или лично через ЕО ГРО) 1.1

Заявка ТП «Недостающие документы предоставлены» Портал ЕОГ  
Устранение замечаний к заявке. Загрузка недостающих документов на Портал через ЛК ЕОГ 1.7

ЕО ГРО  
Предоставление нарочно недостающих документов в ЕО ГРО (заявитель лично или представитель заявителя по доверенности)\*\* 1.8

\*\*Заявитель/представитель заявителя (по доверенности) предоставляет документы нарочно в случае выбора данной формы взаимодействия при подаче заявки при первом обращении в ГРО

Схема реализации мероприятий в рамках предоставления комплекса услуг по газификации (без участия МФЦ)

Этап 2. Подготовка ТУ и договора на ТП

Срок выполнения мероприятий по Этапу №2			Сущ. схема	Эффект
Новая схема				
1	15 раб. дн.	При условии если заявитель подписывает договор в день получения уведомления о его готовности в ГРО или в ЛК ПЕОГ	19 раб. дн.	4 раб. дн.
2	25 раб. дн.	При условии если заявитель берет договор для ознакомления и подписания на срок 10 р. дн в соответствии с ПП РФ 1547	29 раб. дн.	4 раб. дн.
3	45 раб. дн.	При условии если заявитель берет договор для ознакомления и подписания и держит его у себя до 30 р. дн в соответствии с ПП РФ 1547	49 раб. дн.	4 раб. дн.

\* На этапе пилотной эксплуатации задачи по обработке заявки на заключение договора поставки газа (заявка ПГ) на Портале ЕОГ будут выполняться ГРО

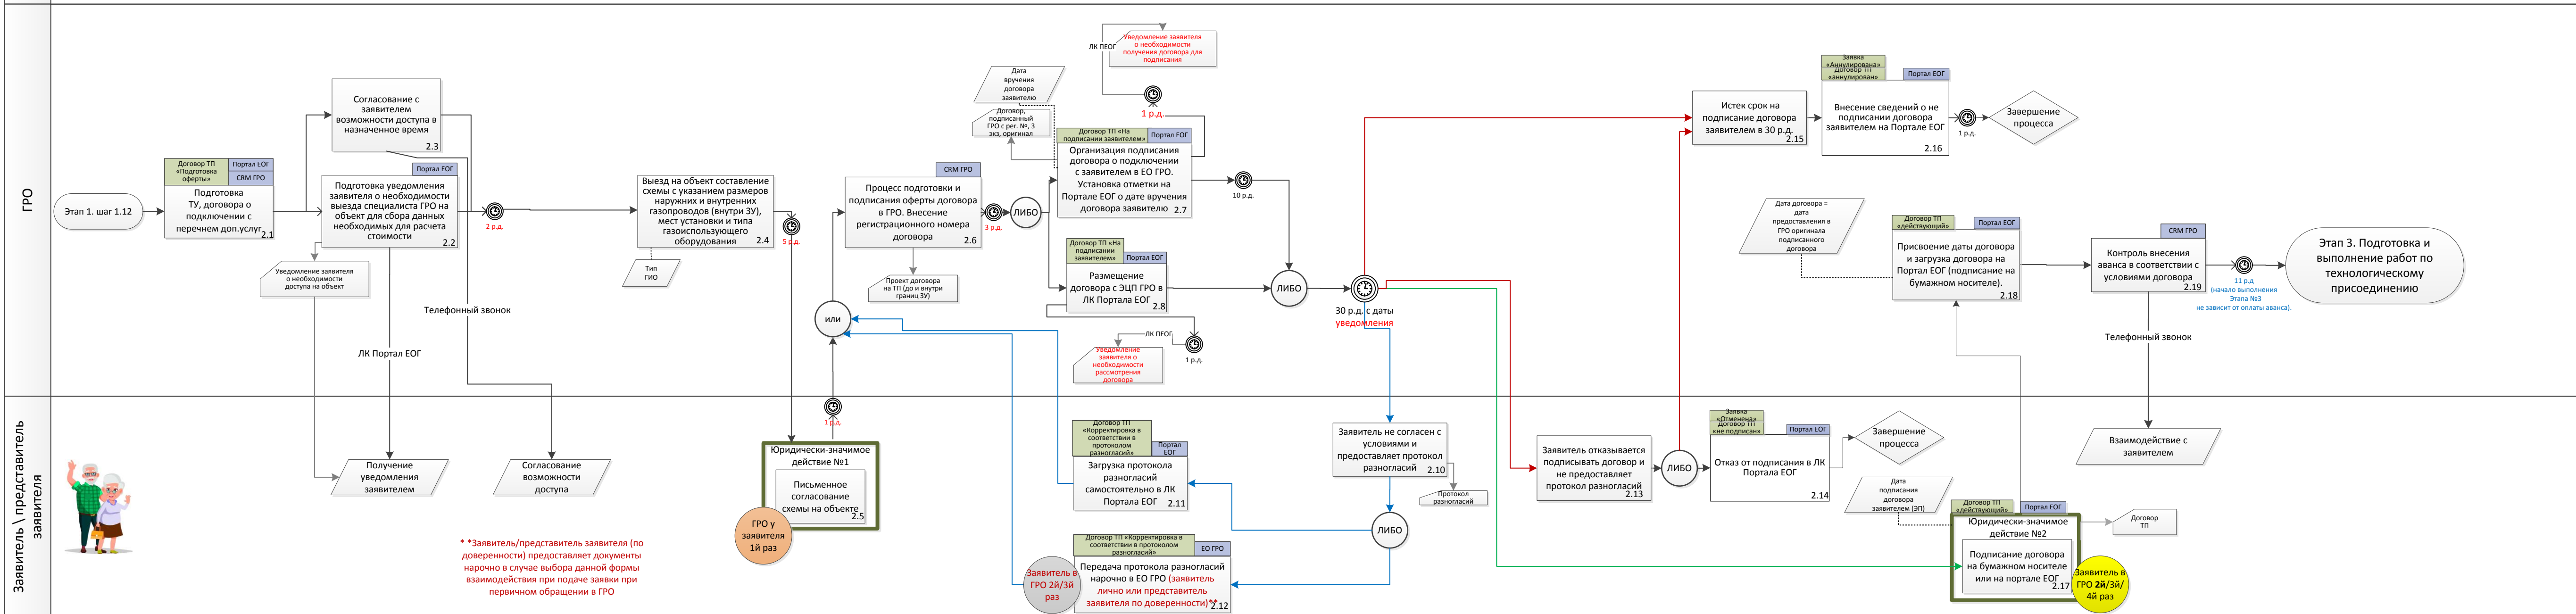


Схема реализации мероприятий в рамках предоставления комплекса услуг по газификации (без участия МФЦ)

Этап 3. Реализация мероприятий по договору на ТП, заключение договора ТО ВДГО

Срок выполнения мероприятий по Этапу №3

№	Срок выполнения	При условии выполнения ГРО мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ (ПИР и СМР газопровода протяженностью до 200 м) в течение 45 р. дн (61 к. дн.) * При этом срок выполнения ГРО мероприятий внутри границ ЗУ составит 31 р. дн (39 к. дн)	Сущ. схема	Эффект
1	61 к. дн.	При условии выполнения ГРО мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ (ПИР и СМР газопровода протяженностью до 200 м) в течение 45 р. дн (61 к. дн.) * При этом срок выполнения ГРО мероприятий внутри границ ЗУ составит 31 р. дн (39 к. дн)	135 к. дн.	74 к. дн
2	142 к. дн.	При условии выполнения ГРО мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ (ПИР и СМР газопровода протяженностью от 200 до 500 м) в течение 102 р. дн (142 к. дн.) * При этом срок выполнения ГРО мероприятий внутри границ ЗУ составит 31 р. дн (39 к. дн)	200 к. дн.	68 к. дн
3	220 к. дн.	При условии выполнения ГРО мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ (ПИР и СМР газопровода протяженностью свыше 500 м) в течение 158 р. дн (220 к. дн.) * При этом срок выполнения ГРО мероприятий внутри границ ЗУ составит 31 р. дн (39 к. дн)	365 к. дн.	145 к. дн

\* Срок выполнения ГРО и состав мероприятий по строительству газопровода до границ ЗУ

Пир	СМР	ИТОГО	Условия (факторы) увеличивающие сроки выполнения ПИР/СМР	
			Увеличение срока выполнения ПИР независимо от протяженности газопровода:	Увеличение срока выполнения СМР независимо от протяженности газопровода:
До 200 метров	Подготовка ПИР (геодезические изыскания и проектирование) – 5 р.дн. Согласования с сетевиками – 7 р.дн., Согласования с ОМС – 3 р.дн. Итого – 15 р.дн.	45 р. дн. (61 к. дн.)	1. Увеличение срока выполнения ПИР независимо от протяженности газопровода: 1. Согласование с владельцами региональных дорог – выдача ТУ – 10 р.дн., согласование проекта до 30 р.дн. Итого - Плюс 40 р.дн.	1. Выполнение работ в случае необходимости асфальтирования участка, восстановление и рекультивации с учетом планирования работ подрядчиками - Плюс 12 р.дн.
От 200 до 500 метров	Подготовка ПИР (геодезические изыскания с согласованиями геология - 20 р.дн и проектирование) – 34 р.дн. Согласования с сетевиками – 7 р.дн., Согласования с ОМС – 3 р.дн. Итого – 44 р.дн.	102 р. дн. (142 к. дн.)	2. Выдача ТУ, выбор створа перехода через РЖД до 30 р.дн. Согласование проекта от 30 р.дн. Итого - Плюс 60 р.дн.	2. Оформление страховочного пакета с РЖД - вызов представителя , планирование работ - Плюс до 65 р.дн.
Свыше 500 метров	Подготовка ПИР (геодезические изыскания с согласованиями геология - 30 р.дн и проектирование - 30 р.дн.) – 60 р.дн. Сметная документация, Согласования с сетевиками – 10р.дн. Согласования с ОМС – 5 р.дн. Итого – 75 р.дн.	158 р. дн. (220 к. дн.)	3. Лесфонд – проект освоения лесов – от 30 к.дн. оформление договора аренды - 30 к.дн, расчет материально денежной оценки от 45 к.дн. проект лесовосстановления, с утверждением – 45 к.дн. Итого - Плюс 150 к.дн.	3. Лесфонд – вырубка, подача и согласование декларация , определение места складирования древесины, восстановление - Плюс 150 к.дн.

\* На этапе пилотной эксплуатации задачи по обработке заявки на заключение договора поставки газа (заявка ПГ) на Портале ЕОГ будут выполняться ГРО

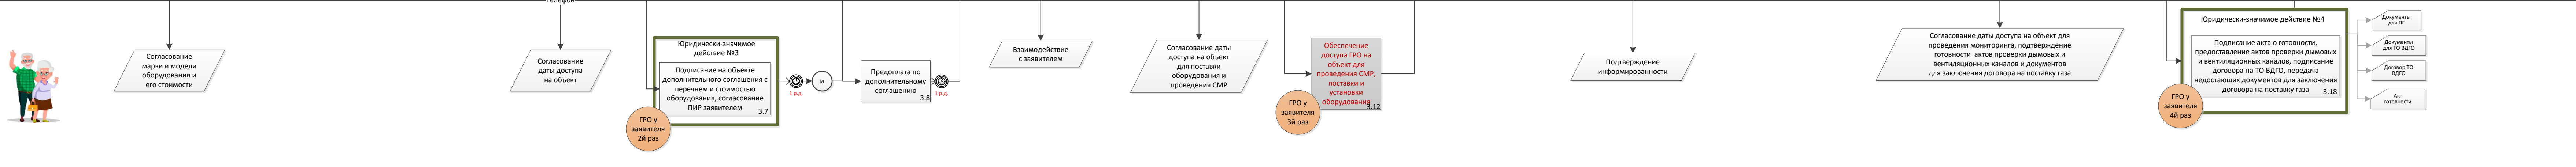
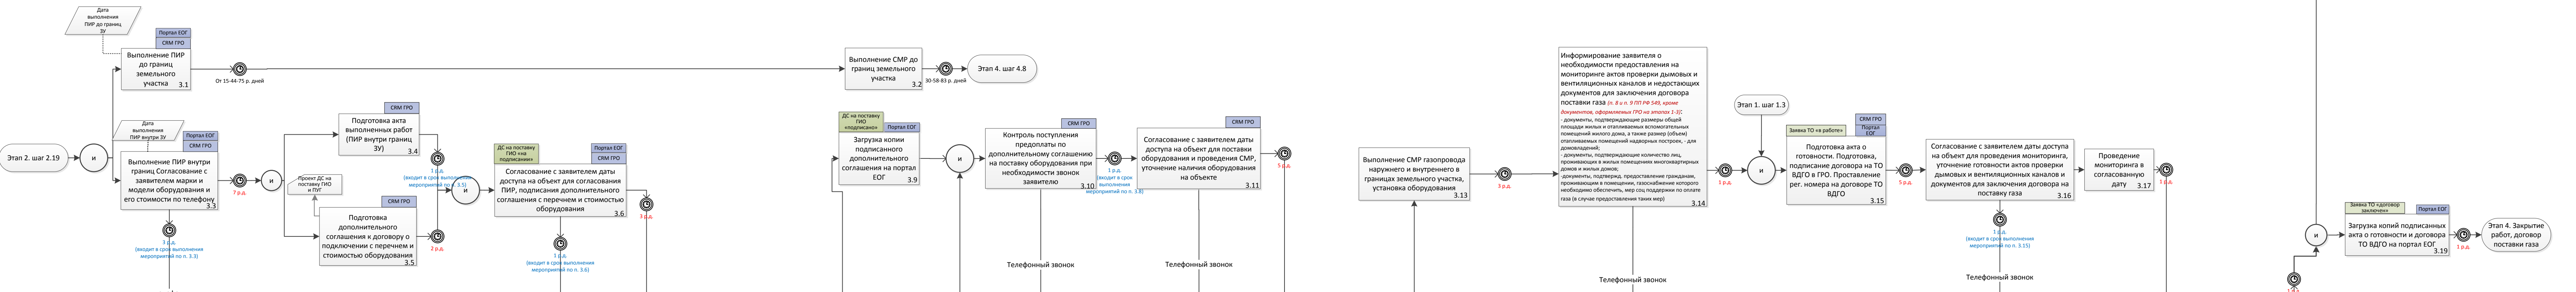



Схема реализации мероприятий в рамках предоставления комплекса услуг по газификации (без участия МФЦ)

Этап 4. Закрытие работ. Заключение договора поставки газа

Срок выполнения мероприятий по Этапу №4  
Новая схема

1	7 раб. дн.	При условии если заявитель передал все недостающие документы для заключения договора поставки газа в соответствии с ПП РФ 549
2	22 раб. дн.	При условии если заявитель передал <b>не</b> все недостающие документы для заключения договора поставки газа в соответствии с ПП РФ 549 и требуется дозапрос недостающих документов у заявителя

Сущ. схема Эффект


22 раб. дн.	15 раб. дн.
22 р.дн./Отказ в заключении договора по истеч 22 раб. дн.	-

Итоговый срок выполнения мероприятий по всем этапам\*\*\*  
Новая схема

1	94 к. дн.	При условии наличия у заявителя необходимых документов для заключения договоров в соответствии с ПП РФ 1547, 410 и 549 и оперативном реагировании заявителя на всех этапах предоставления комплекса услуг
2	235 к. дн./Отказ в заключении договоров на одном из этапов	При условии отсутствия у заявителя при подаче заявки необходимых документов для заключения договоров в соответствии с ПП РФ 1547, 410 и 549, которые могут быть дополнительно предоставлены заявителем, и умеренном реагировании (необходимы доп. сроки на рассмотрение и подписание договора подключения) заявителя на всех этапах предоставления комплекса услуг
3	341 к. дн./Отказ в заключении договоров на одном из этапов	При условии отсутствия у заявителя при подаче заявки необходимых документов для заключения договоров в соответствии с ПП РФ 1547, 410 и 549, необходимости их оформления через МФЦ, и длительном реагировании (необходимы максимально возможные сроки на рассмотрение и подписание договора подключения) заявителя на всех этапах предоставления комплекса услуг

Сущ. схема Эффект

195 к. дн.	101 к. дн.
299 к. дн./Отказ в заключении договоров на одном из этапов	64 к. дн./-
Отказ в заключении договоров на одном из этапов	-

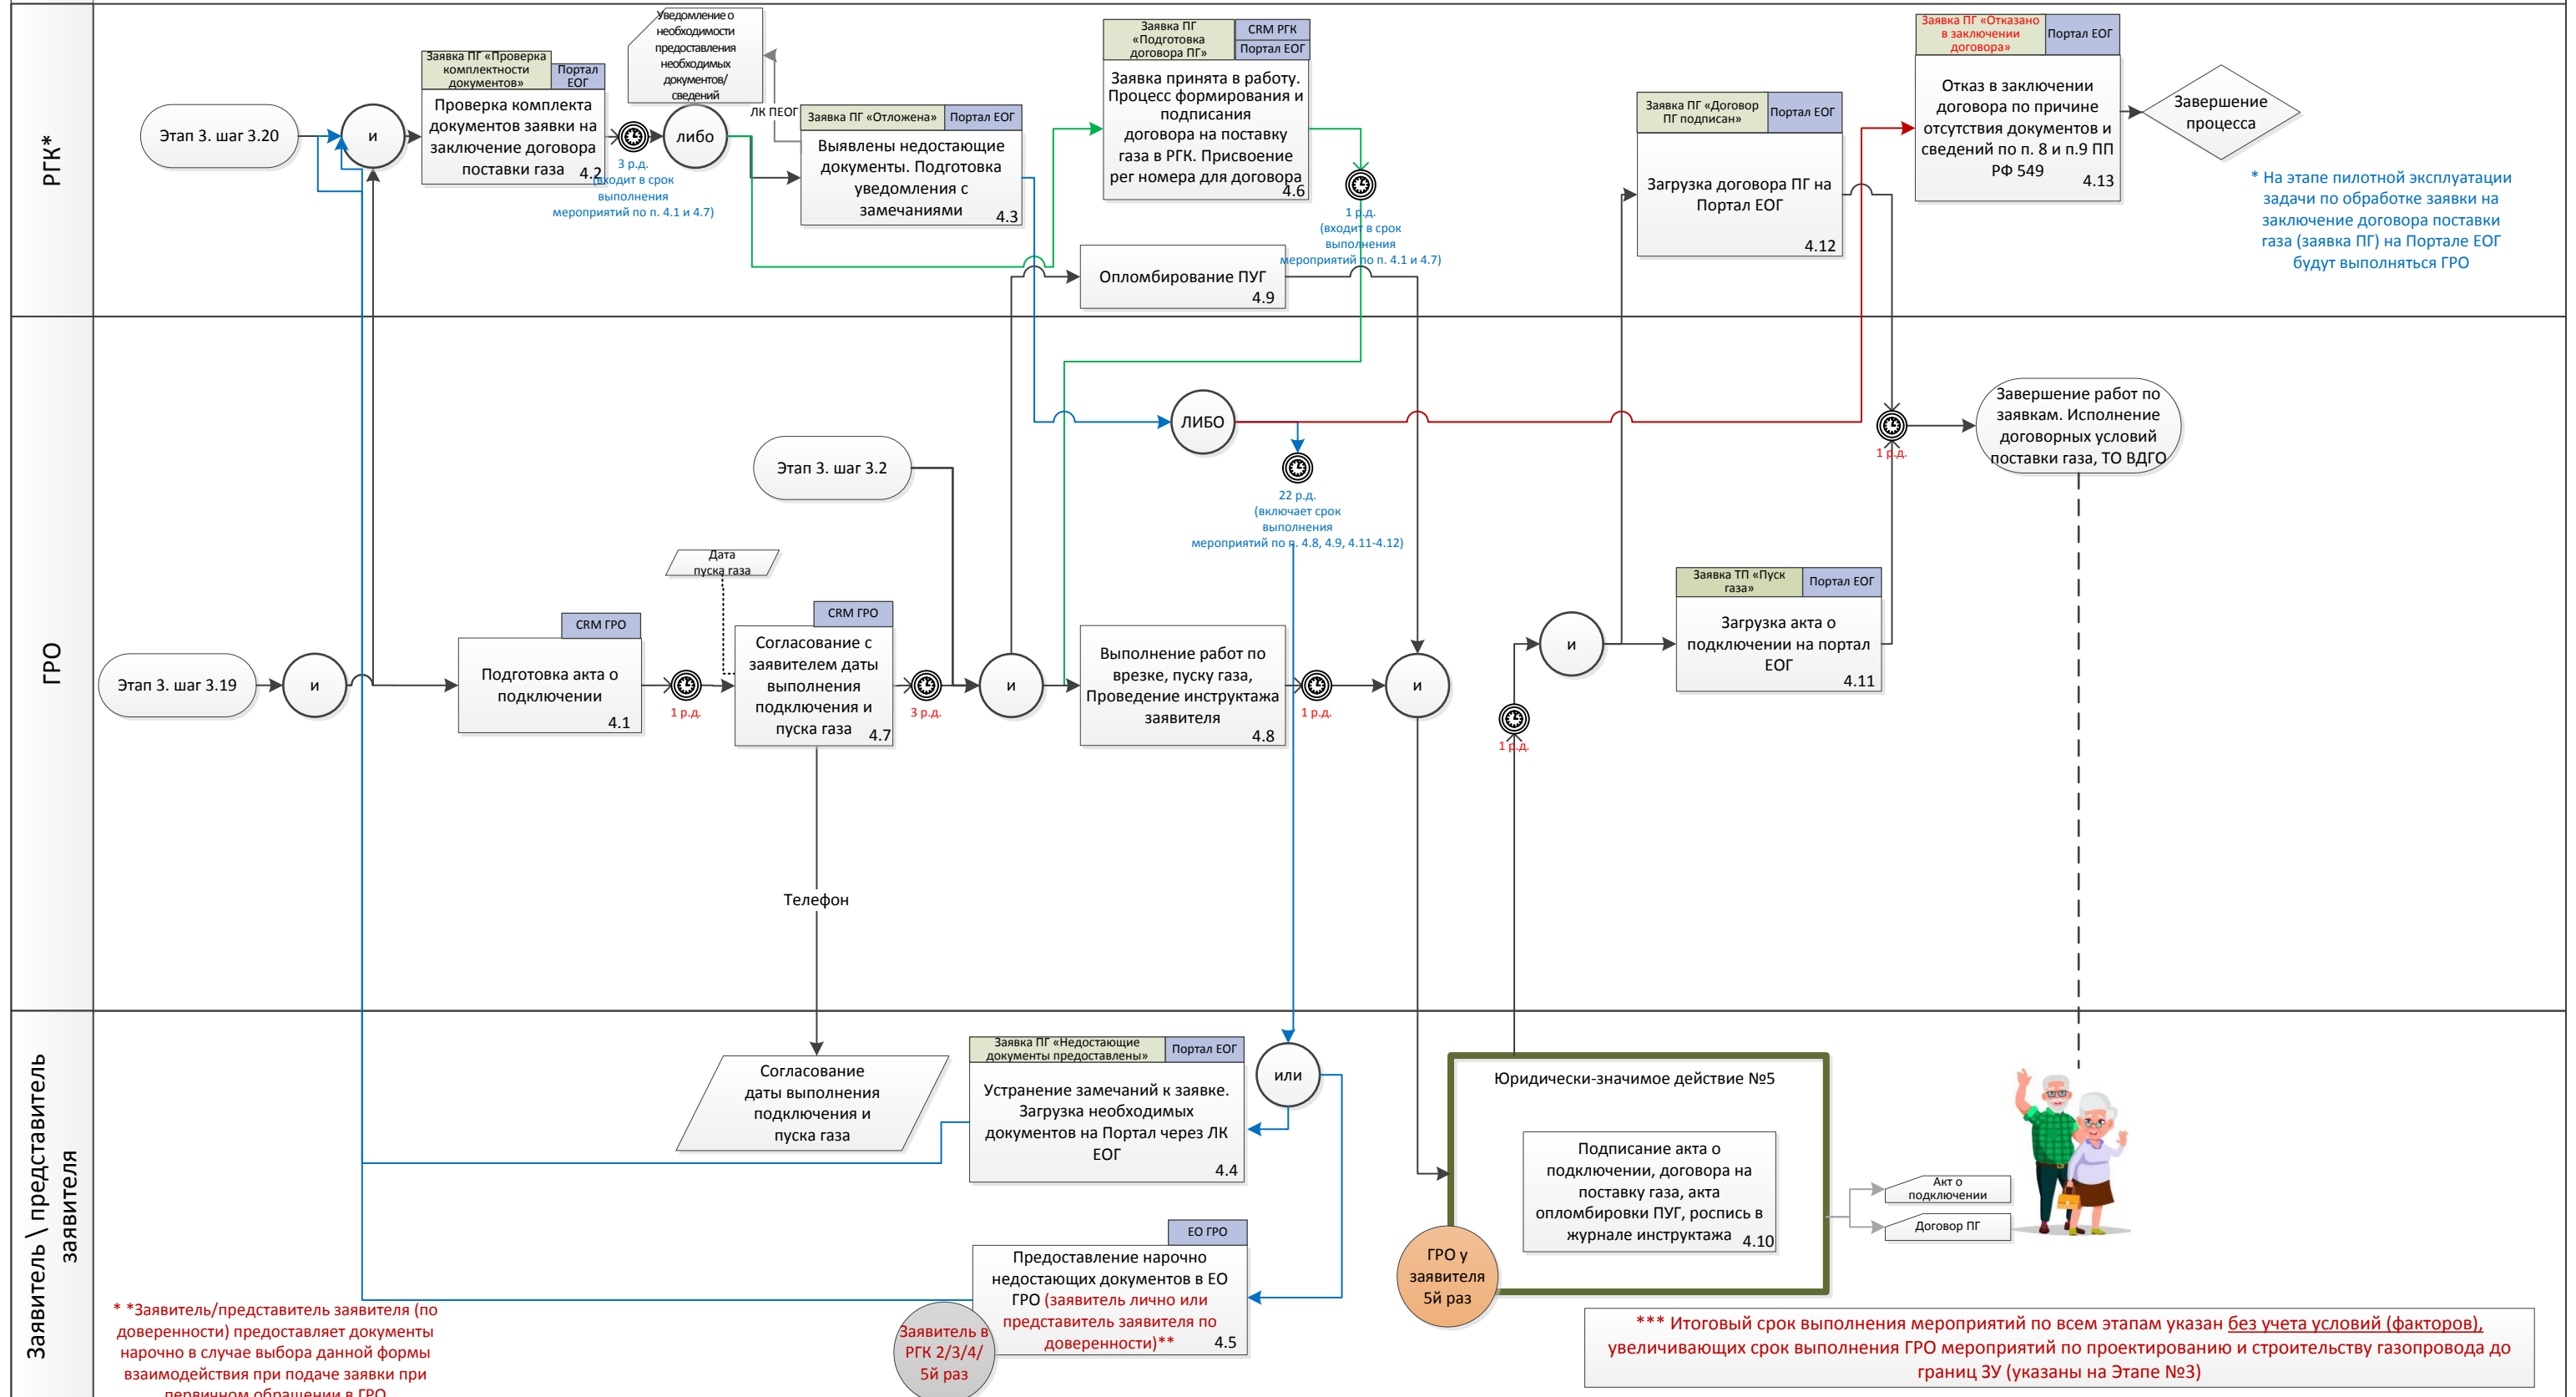

\* На этапе пилотной эксплуатации задачи по обработке заявки на заключение договора поставки газа (заявка ПГ) на Портале ЕОГ будут выполняться ГРО

\*\* Заявитель/представитель заявителя (по доверенности) предоставляет документы нарочно в случае выбора данной формы взаимодействия при подаче заявки при первом обращении в ГРО

Заявитель в РГК 2/3/4/ 5й раз

ГРО у заявителя 5й раз

